


KDMS 개발 일정

KDMS-D06 · v0.1 · 2026-10-06

단계별 기간(안) · 단계 끝 = Mac 에서 완료 기준을 확인한 날 · 오늘 2026-10-06

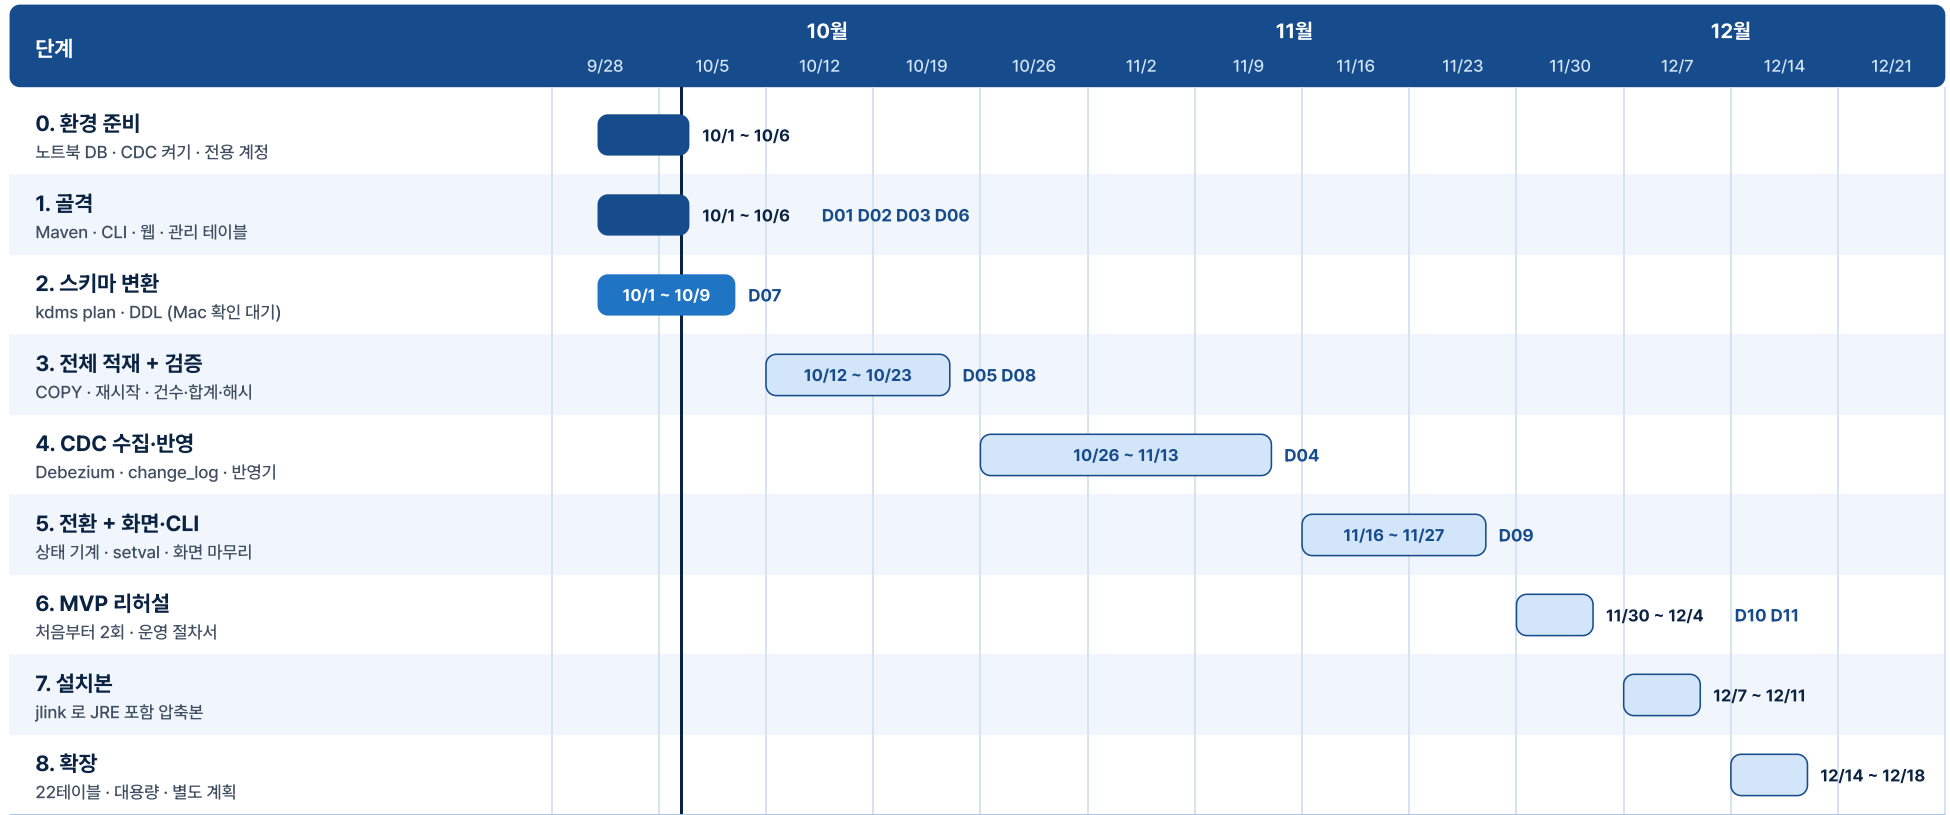

오늘 10/6

범례 완료 진행 중 예정

막대 오른쪽 D 번호: 그 단계에서 함께 만드는 설계 문서 · 3단계 이후 날짜는 안(案)으로 단계가 끝날 때마다 고친다
단계마다 브랜치 하나 + draft PR 하나 · 머지는 사용자가 한다(plan \$6)

1. 단계별 일정(안)

단계	기간(안)	상태	완료 기준 (plan §6)	함께 만들 문서
0. 환경 준비	10/1 ~ 10/6	완료	Mac 에서 1433·5432 접속, <code>KDMS MOCK</code> CDC 켜짐, <code>kdms_app</code> 로그인	—
1. 골격	10/1 ~ 10/6	완료	<code>kdms status</code> 원천·대상 OK(Mac 확인 2026-10-06), 오프라인 빌드, 라이선스 보고서	D01 구성도, D02 아키텍처, D03 흐름도, D06 일정
2. 스키마 변환	10/1 ~ 10/9	진행 중	<code>KDMS MOCK</code> 대상 DDL 이 KIS 정의와 같은 타입(차이는 규칙 파일로 설명). Mac 확인 대기(PR #4)	D07 변환 규칙 매핑표
3. 전체 적재 + 검증	10/12 ~ 10/23	예정	쓰기 없는 상태에서 전 테이블 검증 일치, 적재 중 강제 종료 후 이어서 완료	D05 관리 테이블 ERD, D08 검증 계획서
4. CDC 수집·반영	10/26 ~ 11/13	예정	쓰기 부하 중 적재 → 반영, 쓰기 중지 후 검증 일치	D04 데이터 흐름도
5. 전환 + 화면·CLI	11/16 ~ 11/27	예정	시나리오 S1~S4 통과, 전환 소요 시간 보고	D09 전환·롤백 절차서
6. MVP 리허설	11/30 ~ 12/4	예정	처음부터 2회 모두 합격, 절차서만 보고 다시 할 수 있음	D10 보안·권한, D11 운영 매뉴얼
7. 설치본	12/7 ~ 12/11	예정	자바가 없는 PC 에서 실행	D11 보안
8. 확장	12/14 ~	예정	별도 계획(22테이블, PK 없는 테이블, DDL 변경 감지, 대용량)	—

2. 일정을 정한 방법

- 0~2단계는 저장소 PR 이력 기준이다(2026-10-01 계획 머지, 10-06 1단계 Mac 확인).
- 3단계부터는 plan.md 에 날짜가 없어 이 문서에서 처음 정한 안이다. 기능 규모로 3단계 2주, 4단계(가장 위험이 큼, plan §7 R3~R5) 3주, 5단계 2주, 6·7단계 각 1주로 잡았다.

- 단계가 끝날 때마다 실제 날짜로 고치고 버전을 올린다.
